



# 進捗状況(2024年1月)

【1】高速道路の橋脚(PE-1)基礎工事に  
おいて、土留支保工の設置中。

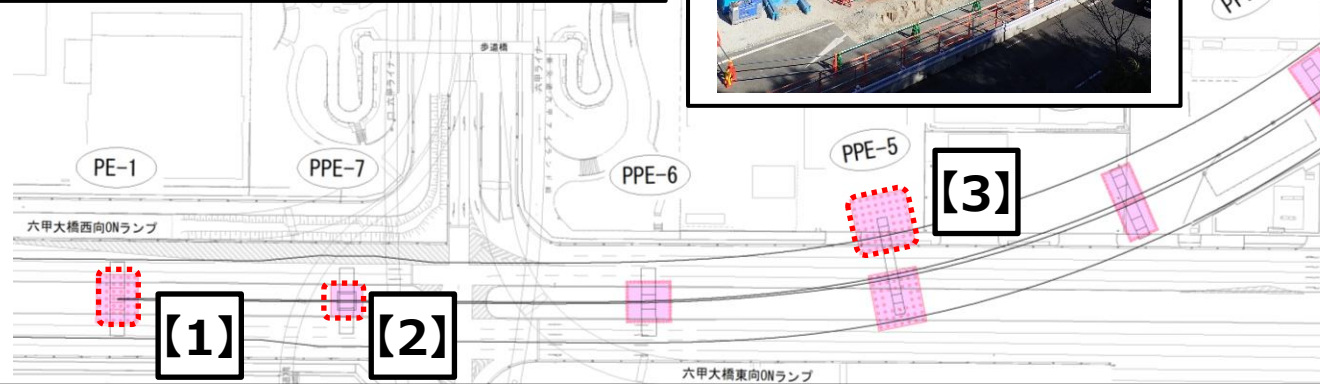

【2】高速道路の橋脚(PPE-7)基礎工事に  
おいて、影響遮断矢板の設置中。

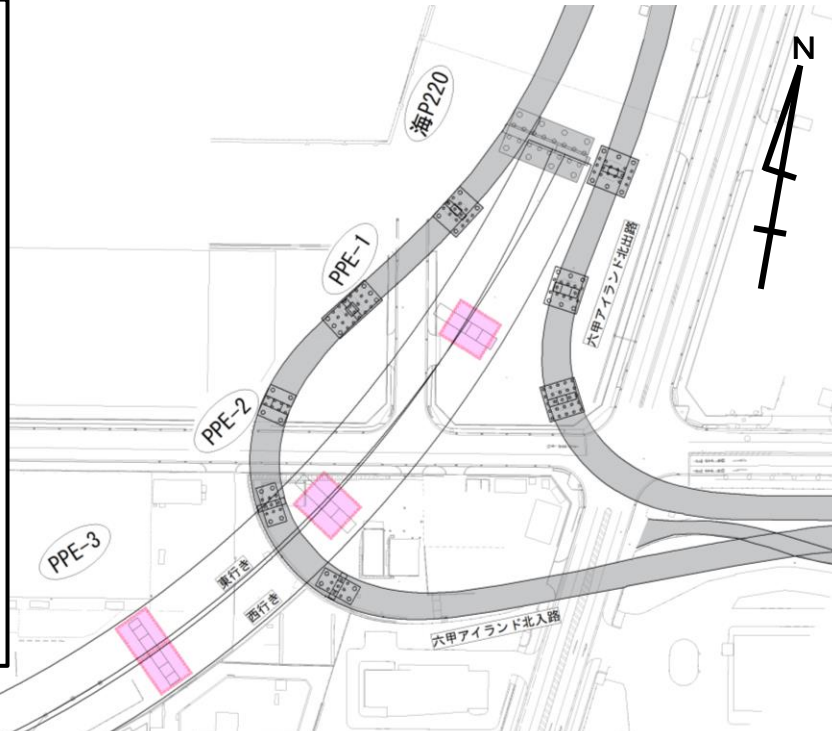

【3】高速道路の橋脚(PPE-5R)基礎工事に  
おいて、オールケーシング工法を用いて  
地中障害物の撤去中。



縦断図 (西行)

