




◆ 開削トンネルの施工ステップ

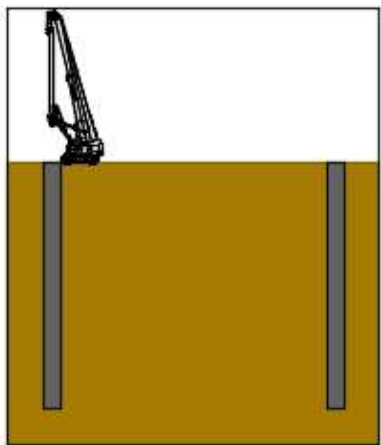


(1) 土留め・遮水を行う。

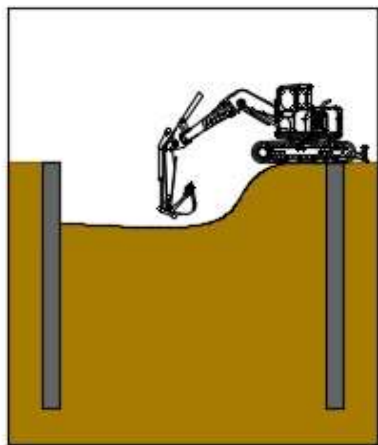

(2) 1次掘削を行う。

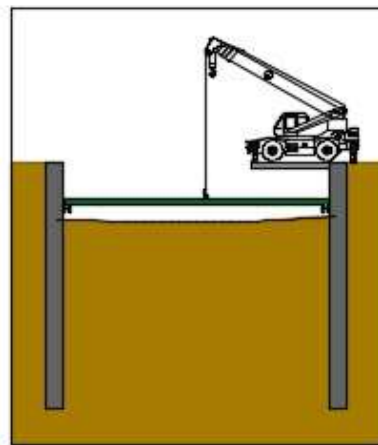


(3) 1段目の切梁・
腹起しを設置する。

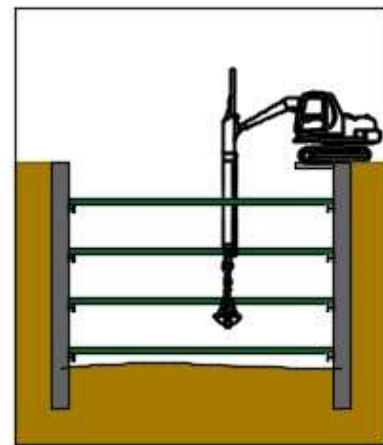


(4) 最下段まで掘削～
切梁・腹起し設置を
繰り返す。




(5) 本体工の底版
を打設する。

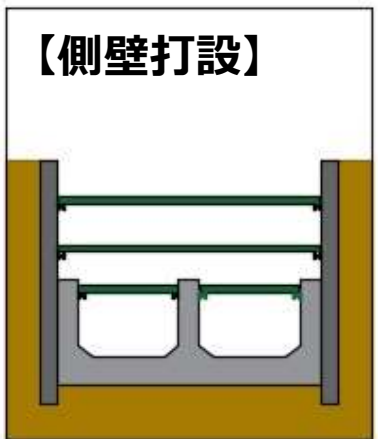

(6) 切梁を外し、
側壁を打設する。

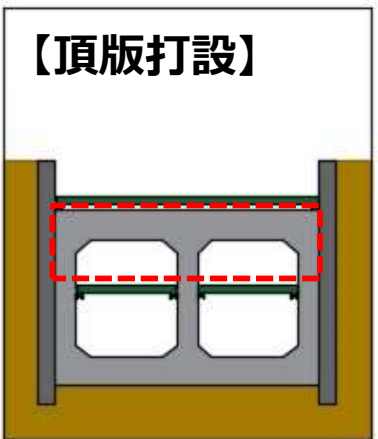

(7) 切梁を外し、
頂版を打設する。

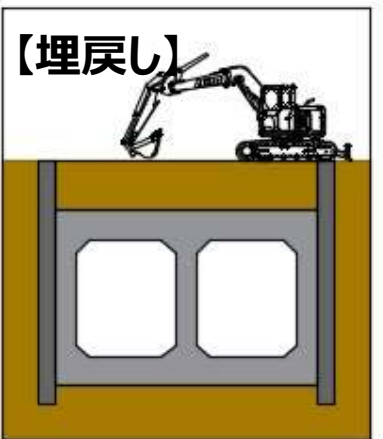

(8) 切梁を外し、
埋め戻し。

施工区間①④：
底版構築実施中

施工区間⑤：
鉄筋組立工・コンクリート打設工を順次実施中

施工区間②：一部区間の埋め戻し工完了
※2025年2月末時点
