
# ◆ ニューマチックケーソン基礎の施工ステップ（PPE-7）※2026年9月末時点




## ①影響遮断矢板打設


掘削時の周辺地盤、構造物への影響を遮断するため矢板を打設します。

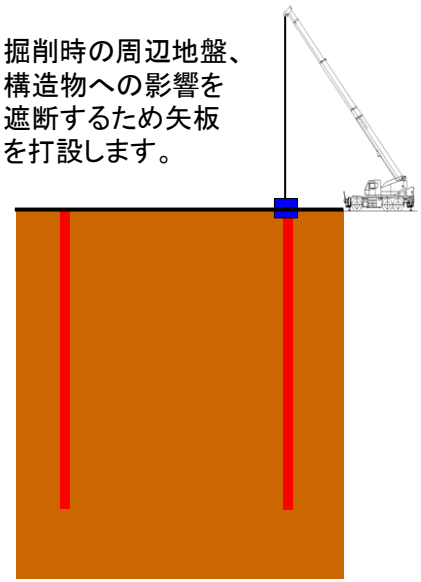


## ②刃口据付

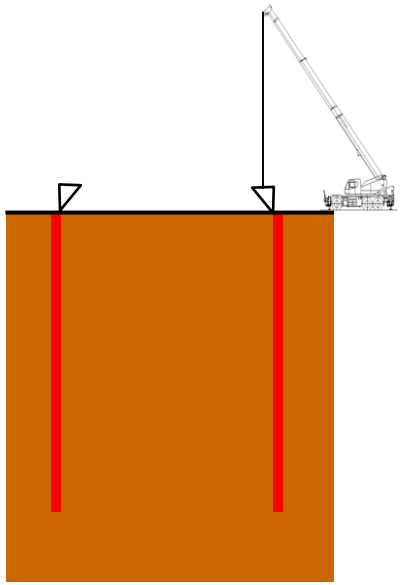

## ③鉄筋工

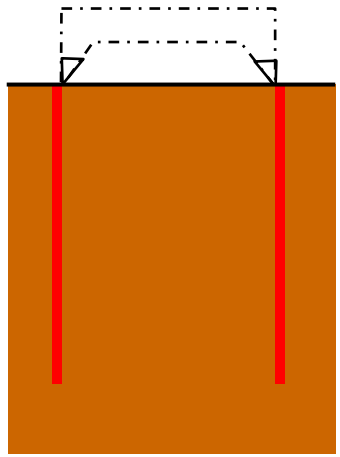


## ④コンクリート打設

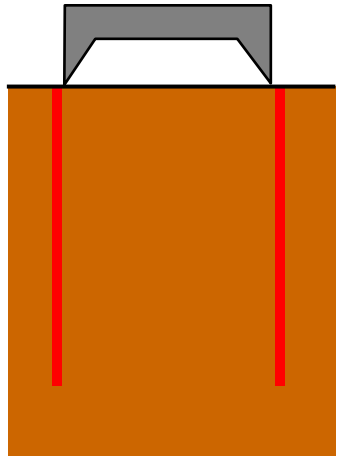


## ⑤沈下掘削


作業室内で沈下掘削を行う。
各ロット毎③～⑤を繰り返す（計12回）。

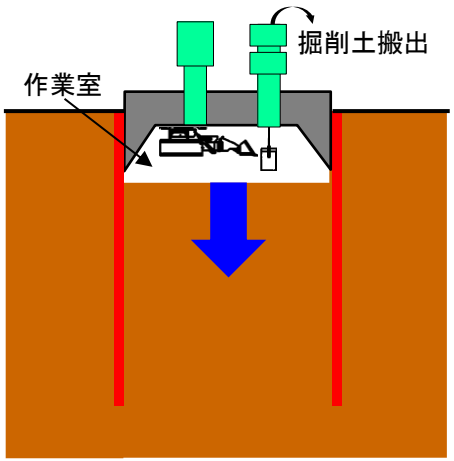


## ⑥中埋めコンクリート打設

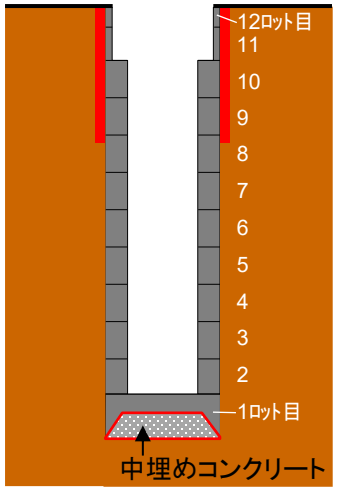


## ⑦中詰め水の注水、頂版コンクリート打設

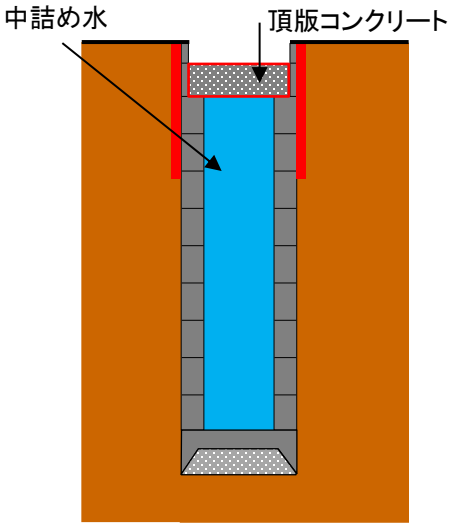


## ⑧影響遮断矢板撤去

